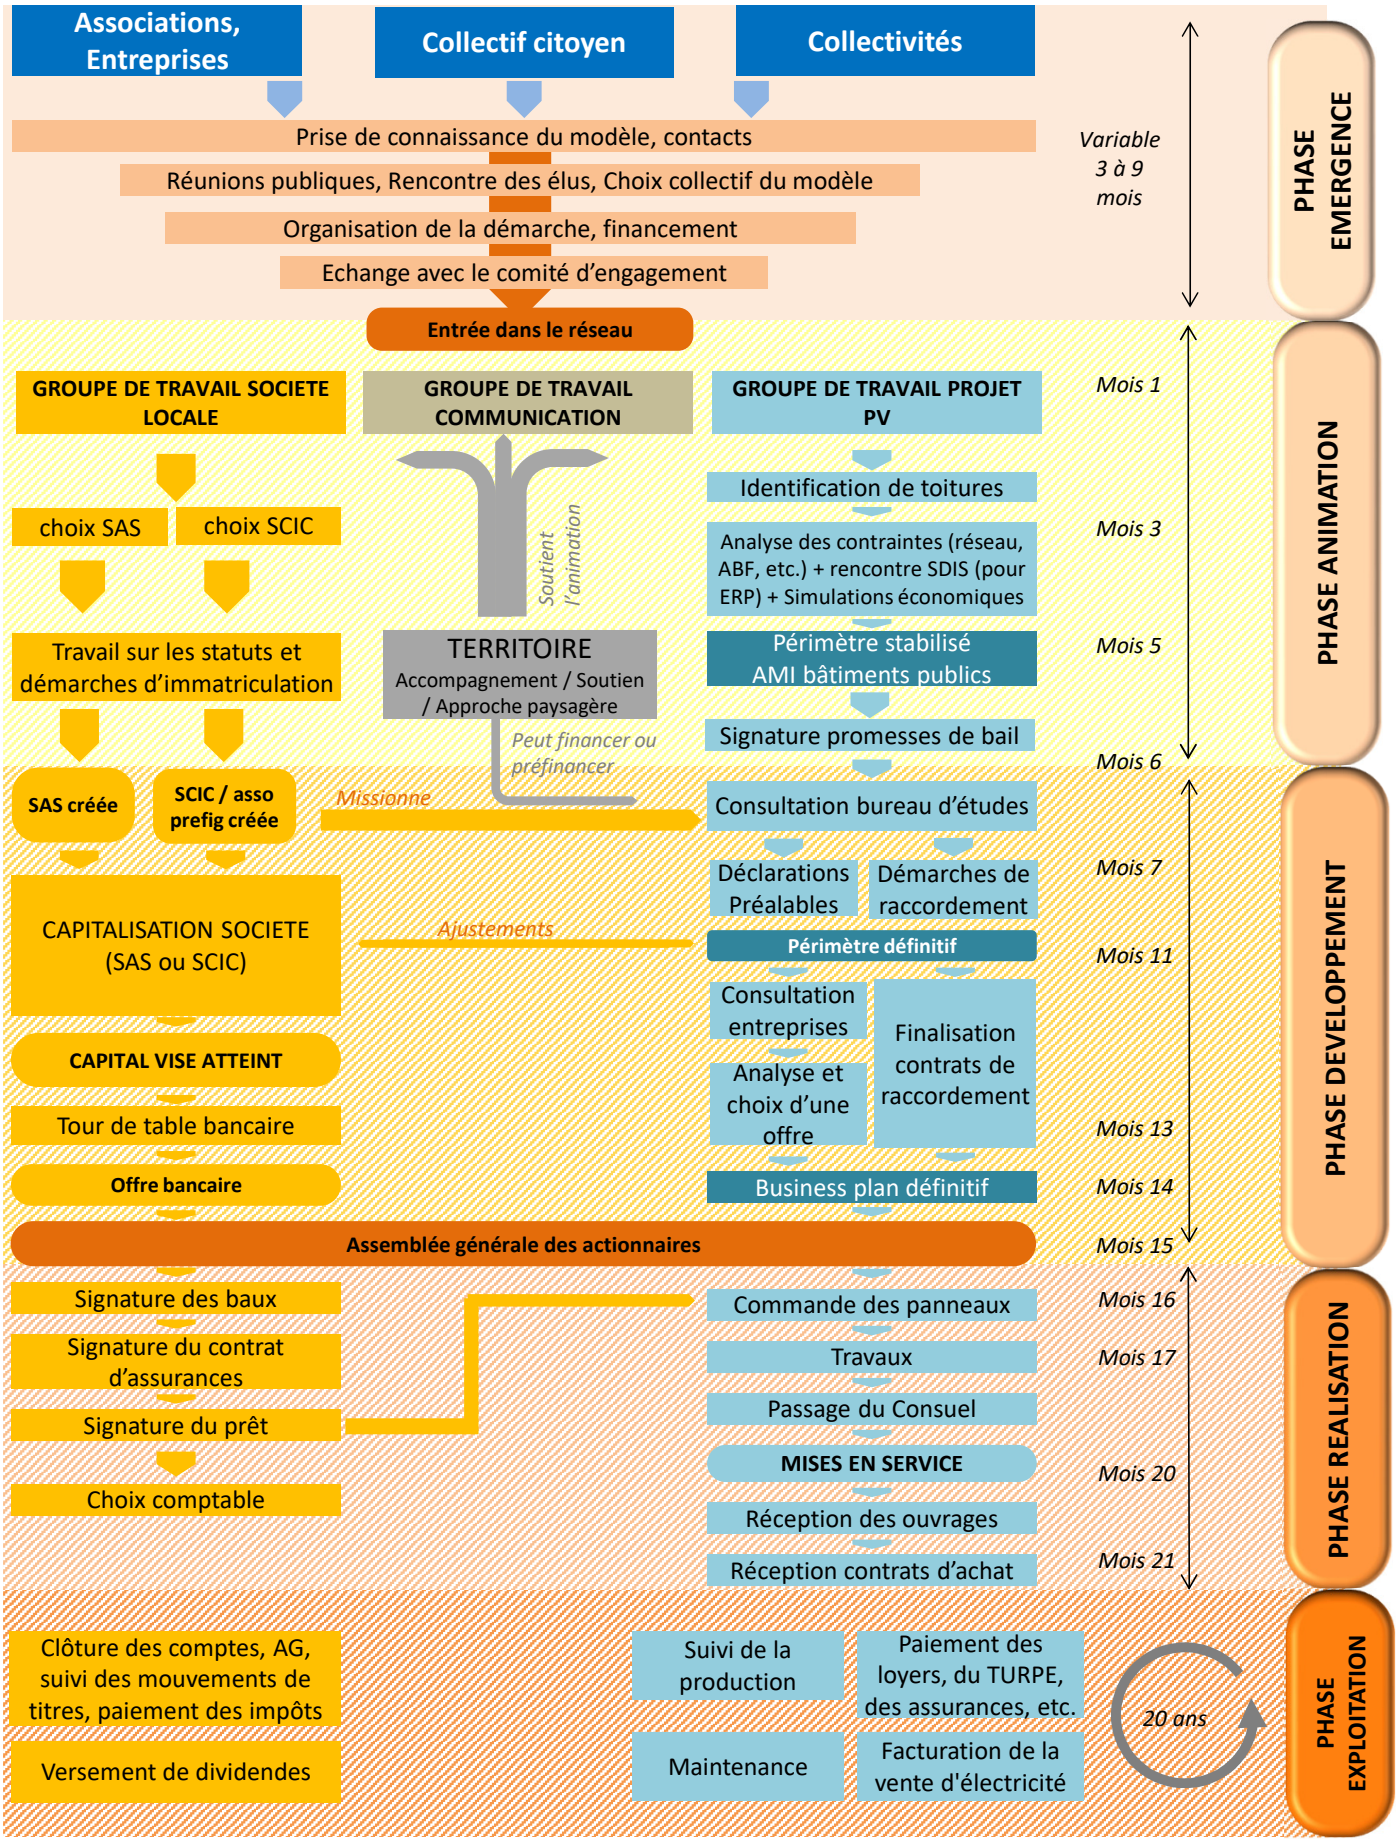
Associations, Entreprises
Collectif citoyen
Collectivités
Prise de connaissance du modèle, contacts
Réunions publiques, Rencontre des élus, Choix collectif du modèle
Organisation de la démarche, financement
Echange avec le comité d'engagement
Variable 3 à 9 mois
PHASE EMERGENCE
Entrée dans le réseau
GROUPE DE TRAVAIL SOCIETE LOCALE
GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
GROUPE DE TRAVAIL PROJET PV
Mois 1
Identification de toitures
Mois 3
Analyse des contraintes (réseau, ABF, etc.) + rencontre SDIS (pour ERP) + Simulations économiques
Mois 5
Périmètre stabilisé AMI bâtiments publics
Signature promesses de bail
Mois 6
PHASE ANIMATION
choix SAS
choix SCIC
Soutient l'animation
Travail sur les statuts et démarches d'immatriculation
TERRITOIRE
Accompagnement / Soutien / Approche paysagère
Peut financer ou préfinancer
SAS créée
SCIC / asso prefig créée
Missionne
Consultation bureau d'études
Mois 7
Déclarations Préalables
Démarches de raccordement
Mois 11
Périmètre définitif
CAPITALISATION SOCIETE (SAS ou SCIC)
Ajustements
Consultation entreprises
Finalisation contrats de raccordement
Analyse et choix d'une offre
Mois 13
CAPITAL VISE ATTEINT
Tour de table bancaire
Offre bancaire
Mois 14
Business plan définitif
Assemblée générale des actionnaires
Mois 15
PHASE DEVELOPPEMENT
Signature des baux
Signature du contrat d'assurances
Signature du prêt
Choix comptable
Commande des panneaux
Mois 16
Travaux
Mois 17
Passage du Consuel
MISES EN SERVICE
Mois 20
Réception des ouvrages
Réception contrats d'achat
Mois 21
PHASE REALISATION
Clôture des comptes, AG, suivi des mouvements de titres, paiement des impôts
Versement de dividendes
Suivi de la production
Paiement des loyers, du TURPE, des assurances, etc.
Maintenance
Facturation de la vente d'électricité
20 ans
PHASE EXPLOITATION
